

Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO SISTEMI VRF

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.** ,

Con la presente siamo a richiedere il PRIMO AVVIAMENTO del sistema VRF GREE

ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi del format.

IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRÀ ESSERE RIFIUTATO

Dati cliente

Sig./Società _____

Via/Piazza _____ n° _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Rivenditore/Agenzia di vendita _____

Dati installatore

Sig./Società _____

Via/Piazza _____ n° _____


Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) _____

ALLEGARE ALLA RICHIESTA LO SCHEMA DI IMPIANTO, COME DA ESEMPIO SOTTOSTANTE, INDICANDO:

- Modelli unità esterne ed interne
- Lunghezze tubazioni del liquido
- Diametri tubazioni del liquido

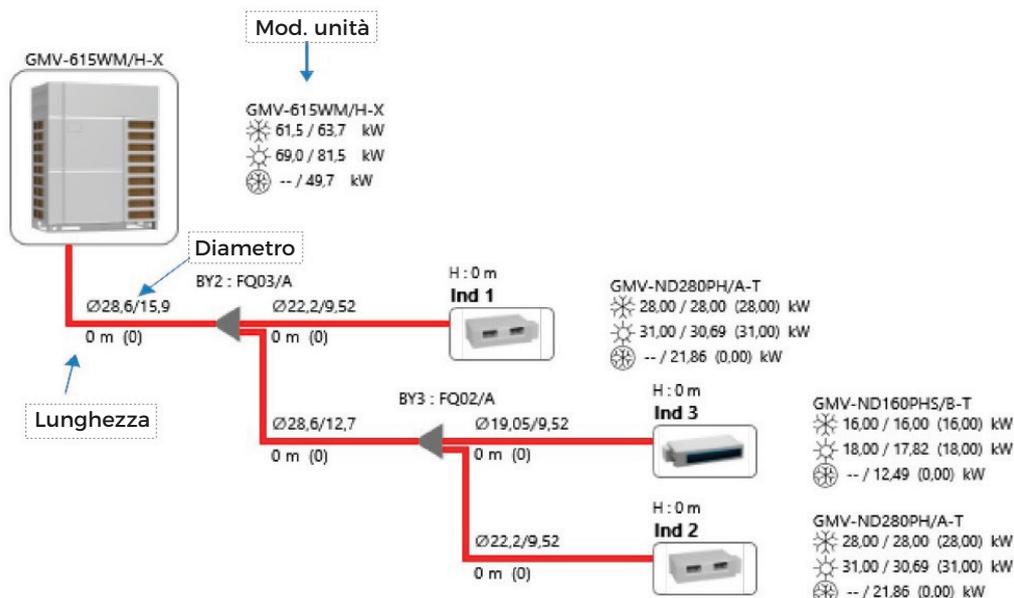

PRIMA DI RICHIEDERE L'AVVIAMENTO, CONFERMARE DI AVERE EFFETTUATO LE SEGUENTI VERIFICHE:

	SÌ	NO
• I prodotti sono stati installati rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza, come previsto dalle norme vigenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato sui manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sono state rispettate le misure (diametri, lunghezze e dislivelli) delle tubazioni del refrigerante, riportate nello schema di impianto allegato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• È stata eseguita la prova di tenuta in pressione d'azoto per almeno 72 ore, senza aver riscontrato perdite (minimo 32 bar, massimo 35 bar);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le tubazioni utilizzate e i kit di distribuzione sono adeguatamente isolati con materiale termico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• I giunti ed i collettori sono stati installati come da manuale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lo scarico della condensa, sia delle unità interne che delle unità esterne, dove è previsto, è stato installato come da manuale e verificato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'impianto elettrico è stato eseguito rispettando gli schemi indicati nel manuale di installazione in dotazione alle unità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'alimentazione elettrica, come da manuale, è garantita per tutte le unità esterne ed è in grado di supportare tutto il carico elettrico (non è ammessa alimentazione elettrica con generatori non certificati);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'alimentazione elettrica, come da manuale, è presente su tutte le unità interne e gli accessori di gestione impianto sono stati correttamente cablati (comandi centralizzati, touch screen, interfacce, altro..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL GIORNO DEL PRIMO AVVIAMENTO, L'INSTALLATORE DOVRÀ GARANTIRE AL CENTRO ASSISTENZA DELEGATO QUANTO SEGUE:

- Presenza per tutta la durata del primo avviamento;
- Schemi meccanici ed elettrici dell'impianto;
- Circuito frigorifero con un grado di vuoto, ottenuto mediante apposita pompa, di almeno 750 torr. Sarà il CAT a confermarne lo stato.
- Bilancia con opportuno fondo scala e gas refrigerante R410A per la carica addizionale (a carico dell'installatore).
- **N.B. - NON è consentito caricare l'impianto prima dell'avviamento ed in assenza del Centro Assistenza che dovrà trovare i rubinetti di intercettazione del gas refrigerante chiusi;**
- Unità esterna/e ed unità interne alimentate elettricamente da almeno 8 ore prima dell'appuntamento con il CAT, per consentire il pre-riscaldamento dell'olio del compressore. Se non vengono rispettate le 8 ore, l'impianto VRF NON potrà essere avviato.

IMPORTANTE

- Il modulo di richiesta primo avviamento dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo mail: argo.postvendita@argoclima.com;
- Il Centro Assistenza verificherà che l'installazione sia conforme a quanto previsto nel manuale d'installazione e congruente con quanto compilato;
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente ad una tensione non adeguata, non potrà essere eseguito l'avviamento.
- Qualora il primo avviamento del sistema non sia stato effettuato da un nostro Centro Assistenza, la garanzia decadrà.

FIRMA PER PRESA VISIONE/CONOSCENZA

FIRMA RICHIEDENTE

TIMBRO RICHIEDENTE

NOTA PER IL CENTRO ASSISTENZA

In caso riceviate questo modulo direttamente dall'installatore, vi invitiamo ad inoltrarlo a: argo.postvendita@argoclima.com
Non intervenire senza autorizzazione.

Prodotto distribuito da:

argoclima S.p.A.

Sede legale: Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Capitale sociale € 13.416.000 i.v. - Codice fiscale e R.I. Brescia 03258640964 - P. IVA n. 03258640964
Cod.Ident.Intracom IT03258640964 - R.E.A. BS-520586 - ECOPEL 060401 - RIDOMUS 060201 - Reg. Naz. Produttori AEE IT11040000007129 - Reg. Naz. Pile IT11040P00002540

Mod.Avviamento 06/2024
